

09/11/2019

OVERVIEW

1. Descrição do Projeto

A realização deste projeto é consequência da mudança de proprietário da Software House que se propõe à realização do mesmo. A aquisição realizada por parte do investidor Azfar Adib PMS, implica mudanças radicais na empresa, sendo que parte dessas mudanças incluêm a criação de um novo logótipo, e novo website/design, alusivo à cultura do novo dono e que satisfaça os seus requesitos e ideais de apresentação gráfica.

2. Scope do Projeto

i In Scope:

- Criação de um novo logótipo/design;
- Criação do conteúdo a ser inserido no novo website;
- Criação do Website dinâmico, e multilingual, com todas as suas páginas e conteúdos requesitados;
- Alojamento do website na Cloud

Out of Scope:

- Utilização de uma ferramenta de controlo de versões (GitHub) e criação do respetivo repositório;
- Escolha do hoster para alojamento do Website e ligação via GitHub para realização de deployments de updates e versão final do Website;

3. Requisitos


Requisitos gerais:

- Novo logotipo, feito com base no novo nome da vossa empresa (PMS2019G3);
- Criar o novo site web da empresa;

O novo Website deve respeitar os seguintes requisites:

- Cores base : verde alface e dourado;
- Design de inspiração árabe;
- Designs clean, com muito espaço em branco, com tipo de letra bonito e texto com letras grandes:
- Dinamismo nas páginas web. Fotos grandes ou vídeos que ocupam muito espaço do ecrã;
- Responsive layout, para funcionar em smart phones, tablets e laptops/desktops;
- Apresentar com destaque cada um dos elementos da nossa equipa, salientando as nossas competências e experiência enquanto Engenheiros de Software;
- Menu burger (três traços horizontais no canto superior direito);
- Página de contactos que inclua a localização no Google Maps;
- Página para candidaturas espontâneas;
- Documentar todo o processo de desenvolvimento, ou seja:
 - Lista hierarquica de tarefas a realizar (Work Breakdown Structure);
 - Estimar o esforço de cada uma das tarefas (várias estimativas de vários participantes, não necessáriamente de todos):
 - Dependencias entre tarefas;
 - Registo de guem fica responsável por cada tarefa;
 - Depois de realizada, registar o tempo efectivamete gasto e quem o fez (podem ser várias pessoas em cada tarefa);
 - Lista de Deliverables;
 - Incluir os deliverables no site, bem integrado no sistema de navegação (menu);

4. Deliverables

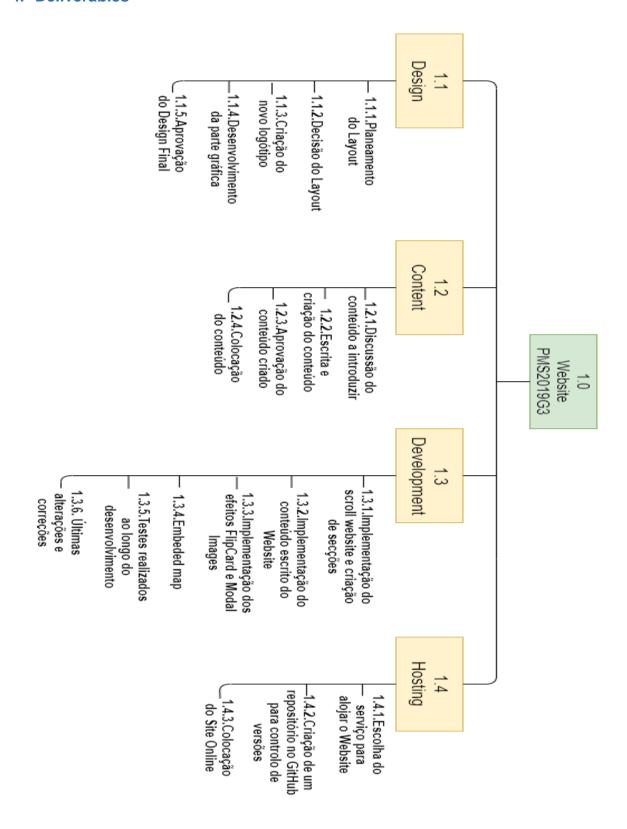

WORK BREAKDOWN STRUCUTRE

Nº Tarefa	Descrição de Tarefa	Complexidade	Relevância	Dependências	Estimativa de Esforço		Estimativa de Horas	Esforço Real		Horas Reais	Responsáveis
					Data de Início D	Data de conclusão		Data de Início Da	Data de conclus		
1.0	Website PMS2019G3 Concluído e publicado	Depende das restantes	Alta	Depende de todas as outras tarefas	25/10/2019	09/11/2019 <mark>124H</mark>	24H	25/10/2019	08/11/2019 80H30		Todos os elementos da equipa
11	Design	Intermédio	Alta	1.2	25/10/2019	09/11/2019 <mark>13H</mark>	32	25/10/2019	07/11/2019 10H		Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
Ħ	Planeamento do Layout (Reunião)	Fácil	Baixa	12	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	MIN	25/10/2019	25/10/2019 30MIN		Todos os elementos da equipa
1.1.2	Decisão do Layout (Reunião)	Fácil	Baixa	12/1.1.1	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	MIN	25/10/2019	25/10/2019 30MIN		Todos os elementos da equipa
1.1.3	Desenvolvimento do logótipo	Intermédio	Alta	1.1.1/1.12	26/10/2019	27/10/2019 1H		26/10/2019	5/11/2019 2H		Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
1.1.4	Desenvolvimento da parte Gráfica	Intermédio	Alta	1.1.1/1.1.2	26/10/2019	27/10/2019 10H30)H30	26/10/2019	5/11/2019 6H30		Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
1.1.5	Aprovação do Design Final	Fácil	Baixa	13.1/1.3.2	09/11/2019	09/11/2019 30MIN	MIN	08/11/2019	07/11/2019 30MIN		Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
1.2	Conteúdo	Intermédio	Médio	1.1/1.3	28/10/2019	9/10/2019 <mark>6H</mark>	_	28/10/2019	5/10/2019 8H		Todos os elementos da equipa
12.1	Discussão do conteúdo a introduzir (Reunião)	Intermédio	Médio	1.1/1.3	28/10/2019	28/10/2019 1H		28/10/2019	28/10/2019 1H		Todos os elementos da equipa
122	Escrita e criação do conteúdo	Fácil	Baixa	12.1	28/10/2019	29/10/2019 3H		28/10/2019	05/10/2019 6H		Todos os elementos da equipa
123	Aprovação do conteúdo criado	Fácil	Baixa	1.3.1/1.3.2	29/10/2019	29/10/2019 1H	_	05/10/2019	05/10/2019 30MIN		Todos os elementos da equipa
12.4	Colocação do Conteúdo	Fácil	Média	1.3.1	30/10/2019	08/11/2019 1H	_	28/10/2019	05/10/2019 30MIN		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3	Development	Intermédio	Alta	1.1	30/10/2019	09/11/2019 <mark>102H</mark>)2H	29/10/2019	08/11/2019 <mark>60H</mark>		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.1	Implementação do website e respetivas páginas	Intermédio	Alta	1.1/1.2	30/10/2019	08/11/2019 80H	H	29/10/2019	07/11/2019 40H		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.2	Upload dos conteúdos criados	Intermédio	Média	1.3.1	91/02/01/08	08/11/2019 8H	T	29/10/2019	07/11/2019 5H		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.3	Criação dos efeitos FlipCard e Modal Image	Intermédio	Média	1.3.1	0102/11/80	08/11/2019 2H		08/11/2019	08/11/2019 6H		Pedro Sousa
1.3.4	Implementação do embeded map	Intermédio	Média	1.3.1	8/11/2019	08/11/2019 2H	_	29/10/2019	07/11/2019 1H		Luís Miguel
1.3.5	Realização de testes ao longo do desenvolvimento	Fácil	Média	1.3.1	30/10/2019	08/11/2019 8H	_	29/10/2019	07/11/2019 5H		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.6	Últimas alterações e correções	Fácil	Média	1.3.1	0102/11/80	08/11/2019 2H		08/11/2019	08/11/2019 3H		Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.4	Hosting	Intermédio	Alta	1.1/1.2/1.3	0102/11/60	09/11/2019 <mark>ЗН</mark>	+	30/10/2019	30/10/2019 <mark>2H30</mark>		Luís Miguel
1.4.1	Escolha do serviço a usar para alojar o website	Fácil	Média	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019 1H		30/10/2019	30/10/2019 30MIN		Luís Miguel
1.4.2	Criação do repositório GitHub	Intermédio	Alta	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019 1H		30/10/2019	30/10/2019 1H		Luís Miguel / Pedro Sousa
1.4.3	Colocação do website online	Intermédio	Alta	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019 1H	4	30/10/2019	30/10/2019 1H		Luís Miguel
	Tarefa adicional de gestão de projeto	Intermédio	Alta	Todas as outras tarefas	25/10/2019	09/11/2019 110H	로	25/10/2019	08/11/2019 65H30		Luís Miguel

TAREFAS/DEPENDÊNCIAS/ESTIMATIVAS/TEMPO REAL/RESPONSÁVEIS
