

09/11/2019

OVERVIEW

1. Descrição do Projeto

A realização deste projeto é consequência da mudança de proprietário da Software House que se propõe à realização do mesmo. A aquisição realizada por parte do investidor Azfar Adib PMS, implica mudanças radicais na empresa, sendo que parte dessas mudanças incluêm a criação de um novo logótipo, e novo website/design, alusivo à cultura do novo dono e que satisfaça os seus requesitos e ideais de apresentação gráfica.

2. Scope do Projeto

i In Scope:

- Criação de um novo logótipo/design;
- Criação do conteúdo a ser inserido no novo website;
- Criação do Website dinâmico, e multilingual, com todas as suas páginas e conteúdos requesitados;
- Alojamento do website na Cloud

Out of Scope:

- Utilização de uma ferramenta de controlo de versões (GitHub) e criação do respetivo repositório;
- Escolha do hoster para alojamento do Website e ligação via GitHub para realização de deployments de updates e versão final do Website;

3. Requisitos


Requisitos gerais:

- Novo logotipo, feito com base no novo nome da vossa empresa (PMS2019G3);
- Criar o novo site web da empresa;

O novo Website deve respeitar os seguintes requisites:

- Cores base : verde alface e dourado;
- Design de inspiração árabe;
- Designs clean, com muito espaço em branco, com tipo de letra bonito e texto com letras grandes:
- Dinamismo nas páginas web. Fotos grandes ou vídeos que ocupam muito espaço do ecrã;
- Responsive layout, para funcionar em smart phones, tablets e laptops/desktops;
- Apresentar com destaque cada um dos elementos da nossa equipa, salientando as nossas competências e experiência enquanto Engenheiros de Software;
- Menu burger (três traços horizontais no canto superior direito);
- Página de contactos que inclua a localização no Google Maps;
- Página para candidaturas espontâneas;
- Documentar todo o processo de desenvolvimento, ou seja:
 - Lista hierarquica de tarefas a realizar (Work Breakdown Structure);
 - Estimar o esforço de cada uma das tarefas (várias estimativas de vários participantes, não necessáriamente de todos):
 - Dependencias entre tarefas;
 - Registo de guem fica responsável por cada tarefa;
 - Depois de realizada, registar o tempo efectivamete gasto e quem o fez (podem ser várias pessoas em cada tarefa);
 - Lista de Deliverables;
 - Incluir os deliverables no site, bem integrado no sistema de navegação (menu);

4. Deliverables

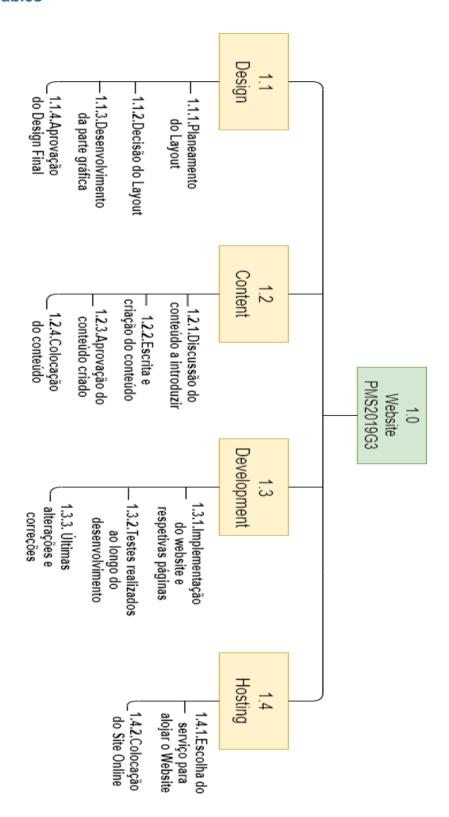

WORK BREAKDOWN STRUCUTRE

Nº Tarefa	Descrição de Tarefa	Complexidade	Relevância	Dependências	Estimativa de Esforço		Estimativa de Horas	Esforço Real	eal Horas Reais	ais Responsáveis
					Data de Início 🔝	Data de conclusão		Data de Início 💮 [Data de conclus	
1.0	Website PMS2019G3 Concluído e publicado	Depende das restantes	Alta	Depende de todas as outras tarefas	25/10/2019	09/11/2019 110H	호	25/10/2019	08/11/2019 65H30	Todos os elementos da equipa
∺	Design	Intermédio	Alta	12	25/10/2019	09/11/2019	HZI,	25/10/2019	07/11/2019 <mark>8H</mark>	Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
<u> </u>	Planeamento do Layout (Reunião)	Fácil	Baixa	12	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	OMIN	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	Todos os elementos da equipa
1.1.2	Decisão do Layout (Reunião)	Fácil	Baixa	12/11.1	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	OMIN	25/10/2019	25/10/2019 30MIN	Todos os elementos da equipa
1.1.3	Desenvolvimento da parte Gráfica	Intermédio	Alta	1.1.1/1.1.2	26/10/2019	27/10/2019 10H30	OH30	26/10/2019	5/11/2019 6H30	Cristovão Gouveia / Nelson Graça
1.1.4	Aprovação do Design Final	Fácil	Baixa	13.1/13.2	09/11/2019	09/11/2019 30MIN	OMIN	08/11/2019	07/11/2019 30MIN	Cristóvão Gouveia / Nelson Graça
1.2	Conteúdo	Intermédio	Médio	1.1/1.3	28/10/2019	9/10/2019 <mark>6H</mark>	=	28/10/2019	5/10/2019 <mark>8H</mark>	Todos os elementos da equipa
121	Discussão do conteúdo a introduzir (Reunião)	Intermédio	Médio	1.1/1.3	28/10/2019	28/10/2019 1H	=	28/10/2019	28/10/2019 1H	Todos os elementos da equipa
12.2	Escrita e criação do conteúdo	Fácil	Baixa	121	28/10/2019	29/10/2019 3H	=	28/10/2019	05/10/2019 6H	Todos os elementos da equipa
12.3	Aprovação do conteúdo criado	Fácil	Baixa	13.1/13.2	29/10/2019	29/10/2019 1H	=	05/10/2019	05/10/2019 30MIN	Todos os elementos da equipa
12.4	Upload do Conteúdo	Fácil	Média	13.1	30/10/2019	09/11/2019	主	28/10/2019	05/10/2019 30MIN	Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3	Development	Intermédio	Alta	II)	30/10/2019	09/11/2019 <mark>90H</mark>	유	29/10/2019	08/11/2019 <mark>48H</mark>	Pedro Sousa / Duarte Gomes
13.1	Implementação do website e respetivas páginas	Intermédio	Alta	1.1/1.2	30/10/2019	08/11/2019 80H	훈	29/10/2019	07/11/2019 40H	Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.2	Realização de testes ao longo do desenvolvimento	Fácil	Média	13.1	30/10/2019	08/11/2019 8H	æ	29/10/2019	07/11/2019 SH	Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.3.3	Últimas alterações e correções	Fácil	Média	13.1	08/11/2019	08/11/2019 2H	Œ	08/11/2019	08/11/2019 3H	Pedro Sousa / Duarte Gomes
1.1	Hosting	Intermédio	Alta	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019 <mark>2H</mark>	H	30/10/2019	30/10/2019 <mark>1H30</mark>	Luís Miguel
1.4.1	Escolha do serviço a usar para alojar o website	Fácil	Média	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019	1H	30/10/2019	30/10/2019 30MIN	Luís Miguel
1.4.2	Colocação do website online	Intermédio	Alta	1.1/1.2/1.3	09/11/2019	09/11/2019 1H	=	30/10/2019	30/10/2019 1H	Luís Miguel
	- Tarefa adicional de gestão de projeto	Intermédio	Alta	Todas as outras tarefas	25/10/2019	09/11/2019 110H	10H	25/10/2019	08/11/2019 65H30	Luís Migue

TAREFAS/DEPENDÊNCIAS/ESTIMATIVAS/TEMPO REAL/RESPONSÁVEIS
